


INFORME DE GESTIÓN 2017



ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.



CO-60-CER003794



SO-CER593764



GA-CER503766



6. Gestión de Planeación

6.1 Plan de Acción 2016 – 2019 – Año 2017

La Junta Directiva de la entidad, aprobó el 26 de mayo de 2016, el Plan de Acción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para el período 2016 – 2019, asignando para la vigencia 2017 un presupuesto por valor total de \$18.617.050.000, el cual fue modificado (adicionado) en el mes de mayo de 2017 en \$4.299.286.234 para un gran total de \$22.916.336.234 y en el mes de noviembre de 2017, quedando el presupuesto definitivo del Plan de Acción en \$18.016.336.234.00, de los cuales \$10.461'802.955.00 correspondían a Recursos Propios y \$7.554'533.279.00 a Recursos Subsidios. Al 31 de diciembre de 2017, la ejecución del Plan de Acción en sus seis (6) ejes fue de \$15.124.774.170, equivalentes al 83.95%, de los cuales \$8.815'794.502.00 corresponden a Recursos Propios y \$6.308'979.668.00 a Recursos Subsidios.

2017						
Eje	Programa	EJE Y PROGRAMA	INICIAL	MODIFICACION MAYO	MODIFICACION NOVIEMBRE	EJECUCION
1		Gestión financiera	1.416.000.000	1.416.000.000	216.000.000	214.196.401 99,17%
	1	Mejoramiento de ingresos	1.416.000.000	1.416.000.000	216.000.000	214.196.401 99,17%
2		Recurso Humano Constructor de Bienestar	455.000.000	455.000.000	205.000.000	26.838.000 13,09%
	2	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	180.000.000	180.000.000	180.000.000	26.838.000 14,91%
	3	Desarrollo de Personal	200.000.000	200.000.000	25.000.000	0 0,00%
	4	Bienestar social	75.000.000	75.000.000	0	0 0,00%
3		Mejores servicios para nuestra comunidad.	770.000.000	864.286.234	339.000.000	137.702.290 40,62%
	5	Imagen Corporativa	650.000.000	744.286.234	329.000.000	128.018.790 38,91%
	6	Atención a Clientes y partes interesadas	120.000.000	120.000.000	10.000.000	9.683.500 96,84%
4		Gestión de procesos	2.638.000.000	2.424.000.000	2.306.500.000	1.617.222.443 70,12%
	7	Sistemas integrales de Gestión	730.000.000	730.000.000	612.500.000	612.173.700 99,95%
	8	Sistemas de información corporativo	1.908.000.000	1.694.000.000	1.694.000.000	1.005.048.743 59,33%
5		Mas agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad.	12.711.050.000	17.130.050.000	14.322.836.234	12.529.214.089 87,48%
	9	Producción de agua potable	6.886.050.000	10.836.050.000	6.598.550.000	6.494.523.739 98,42%
	10	Distribución de agua Potable	2.693.000.000	2.851.000.000	2.227.006.219	1.628.803.359 73,14%
	11	Disposición de aguas residuales	3.132.000.000	3.443.000.000	5.497.280.015	4.405.886.991 80,15%
6		Construyendo Ambiente para la Paz	627.000.000	627.000.000	627.000.000	599.589.637 95,63%
	12	Conservación y Recuperación del recurso hídrico	627.000.000	627.000.000	627.000.000	599.589.637 95,63%
		TOTAL	18.617.050.000	22.916.336.234	18.016.336.234	15.124.762.860 83,95%

83,95%



Metas por Programas y Proyectos 2017

EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES	APROBADO	META	META ALCANZADA	% EJECUCION	EJECUTADO	
1. GESTION FINANCIERA	PROGRAMA: Mejoramiento de ingresos							
	Micromedición	Instalar y/o reponer los medidores	16.000.000	Cobertura de Micromedición	98,70%	99,40%	100,00%	14.926.401
		Creación del Fondo de Reposición de Medidores	50.000.000					50.000.000
	Reducción de Pérdidas	Mínimizar errores en las lecturas de los medidores.	40.000.000	Metros Cúbicos Facturados por Suscriptor Mes	8,63	8,32	100%	39.270.000
	Recuperación de Cartera	Implementar el cobro persuasivo y ejecutivo	60.000.000	Rotación de Cartera	62	72,61	82,89%	60.000.000
				Eficiencia del Recaudo	97	97%	99,58%	
Nuevos Negocios y Mercados	Realizar análisis, evaluación y estudios de mercado.	40.000.000	Negocios Gestionados	1	4	100%	40.000.000	
	Identificar los usuarios potenciales, conocer sus necesidades y socializar los servicios prestados.	10.000.000					10.000.000	
2. RECURSO HUMANO: CONSTRUCTOR DE BIENESTAR	PROGRAMA: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo							
	Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementación de la matriz de riesgos generales al interior de la empresas	27.500.000	Programa Definido e Implementado	100,00%	100,00%	100,00%	26.838.000
		Adquirir equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgo.	152.500.000		25,00%	0,00%	0,00%	
	PROGRAMA: Desarrollo de Personal							
Mejoramiento de las Competencias del Personal	Diseñar e implementar el seguimiento a la Gestión individual.	25.000.000	Cubrimiento de Competencias	90,00%	0,00%	0,00%		
3. MEJORES SERVICIOS PARA NUESTRA COMUNIDAD	PROGRAMA: Imagen Corporativa							
	Mejoramiento y/o Adquisición de sedes	Adecuación, mejoramiento y/o Mantenimiento sedes de Propiedad de la Empresa.	200.000.000	Sedes Intervenidas	3	0	0,00%	0
		Diseño y elaboración de encuestas para medir la percepción del Cliente.	25.000.000					
	Mejoramiento y ejecución del plan de comunicación	Ejecutar acciones tendientes a definir y ejecutar la Identidad Corporativa.	30.000.000	Nivel de Satisfacción de los Usuarios	12,50%	10,00%	80,00%	30.000.000
		Diseñar estrategias que garanticen una adecuada y eficaz comunicación interna y externa.	70.000.000					70.000.000
		Realizar actividades en los municipios relacionados con la prestación de los servicios.	4.000.000					3.018.790
PROGRAMA: Atención a Clientes y partes interesadas								
Atención Al Cliente	Mantener actualizado a los funcionarios de atención al cliente en temas relacionados con Regulación, procesos comerciales, tarifas, PQR, rangos de consumo etc.	2.000.000	Reclamos comerciales por facturación resueltas a favor del usuario en segunda instancia.	<=684	9	100,00%	1.872.200	
	Generar espacios de integración participativa con la comunidad.	7.500.000					7.446.800	
	Apoyar eventos programados por la SSPD, CRA, Comites de Desarrollo y Control Social, Vocales de Control, etc.	500.000					Indice General de Reclamos	4,5

EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES	APROBADO	META	META ALCANZADA	% EJECUCION	EJECUTADO	
4. GESTION DE PROCESOS	PROGRAMA: Sistemas integrales de Gestión							
	Mejoramiento de los Sistemas de gestión de Calidad y control interno, normas NTCGP-1000, 17025, MECI	Implementación de Acciones de mejora.	35.000.000	Mantener el Certificado de Calidad	100,00%	100,00%	100,00%	35.000.000
		Seguimiento a los controles.	25.000.000					25.000.000
		Auditorías Internas y de Certificación.	12.500.000					12.173.700
		Diseño, Elaboración, ejecución y evaluación de indicadores.	10.000.000					10.000.000
		Control Documental del Sistema de Gestión.	10.000.000					10.000.000
	Elaboración del Plan Prospectivo	Elaboración del plan.	140.000.000	Plan Prospectivo Formulado	100,00%	50,00%	50,00%	140.000.000
	Elaboración del plan de Emergencia y Contingencia	Elaboración del plan.	380.000.000	Plan de Contingencia Elaborado y Aprobado	100,00%	30,00%	30,00%	380.000.000
	PROGRAMA: Sistemas de información corporativo							
	Mejoramiento de los Sistemas de Información Corporativo	Implementar y/o mejorar los sistemas de información.	480.000.000	Implementar el Sistema de Nómina, Costos ABC y Calidad.	100,00%	30,00%	30,00%	112.671.971
		Adquisición de Equipos de computo y comunicaciones.	700.000.000	Equipos Adquiridos	50	71	100%	591.846.770
		Adquisición y/o actualización de licencias de software.	514.000.000	Licencias Adquiridas	60	45	75%	300.530.002
PROGRAMA: Producción de Agua Potable								
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Control Operacional	Macromedición: Medición y control de caudales en la producción de agua en los municipios del Valle del Cauca	516.000.000	Cobertura de Acueducto	100,00%	100,00%	200,00%	514.352.969
		Equipos para el control operacional en la Producción de Agua.	413.000.000					363.706.772
	Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Extensión y Optimización	Elaboración de estudios y diseños para el componente de producción de agua potable en los municipios del Valle del Cauca.	109.000.000	Calidad del Agua IRCA	2	1,8	100%	108.900.382
		Estudios y obras de nuevas fuentes de abastecimiento.	558.050.000					558.002.305
		Estudios y/o obras de ampliación y optimización de plantas.	4.784.000.000					4.731.159.738
	Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Extensión y Optimización	Estudios y obras de ampliación, rehabilitación, reposición, extensión y optimización de captaciones, desarenadores y aducciones.	218.500.000					218.401.573



EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES	APROBADO	META	META ALCANZADA	% EJECUCION	EJECUTADO	
PROGRAMA: Distribución de Agua Potable								
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Control Operacional	Macromedición.	110.000.000				109.531.907	
		Control y Telemetría de Redes de Distribución.	436.500.000	Continuidad del Servicio	96,30%	98,99%	100,00%	436.133.446
		Control de la operación, monitoreo y sectorización de redes.	232.000.000					230.313.259
	Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Extensión y Optimización	Estudios y obras de ampliación y/o rehabilitación del sistema de distribución.	1.348.506.219	Indice de Agua no Contabilizada	33,00%	34,35%	95,91%	753.386.998
	Control de calidad de agua potable	Adquisición de Equipos para la medición de la Calidad del Agua.	100.000.000					99.438.349
PROGRAMA: Disposición de aguas residuales								
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Extensión y Optimización	Estudios y obras de ampliación y/o rehabilitación del sistema de recolección y/o transporte y/o del	655.000.000	Cobertura de Alcantarillado	98,40%	98,00%	95,00%	652.285.033
		Estudios y obras de reposición y/o extensión del sistema de recolección y/o transporte y/o del sistema de tratamiento de aguas residuales.	4.842.280.015	Cobertura de Aguas Residuales	23,32%	19,38%	83,00%	3.753.601.958
PROGRAMA: Conservación y Recuperación del recurso hídrico								
6. CONSTRUYENDO AMBIENTE PARA LA PAZ	Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas abastecedoras de los acueductos	Realizar actividades de conservación, protección y restauración ambiental mediante el establecimiento de 105 kilómetros de aislamientos en zonas de nacimientos de agua y amortiguamiento en cuencas hidrográficas prioritizadas abastecedoras.	219.000.000	kms de aislamiento intervenidos	25	0	0	205.860.000
		Realizar actividades de restauración mediante el enriquecimiento forestal con especies nativas de 100 Hectáreas en zonas de nacimientos de agua y amortiguamiento en cuencas hidrográficas prioritizadas abastecedoras.	82.000.000	Hectáreas Restauradas	25	0	0	78.720.000
		Realizar actividades de restauración mediante el establecimiento de 75 hectáreas de sistemas silvopastoriles en zonas de amortiguamiento en cuencas hidrográficas prioritizadas abastecedoras.	58.000.000	Hectáreas Restauradas	15	0	0	58.000.000
		Adelantar acciones para el mejoramiento de la calidad del agua mediante la implementación de 46 sistemas individuales en manejo de aguas servidas en cuencas hidrográficas prioritizadas abastecedoras de los acueductos operados.	36.000.000	Soluciones Implementadas	12	0	0	36.000.000
		Realizar actividades de restauración mediante la construcción de obras biomecánicas para el control de erosión en zonas de nacimientos de agua y amortiguamiento en 4 cuencas hidrográficas prioritizadas abastecedoras.	50.000.000	Obras Biomecánicas Construidas	1	0	0	50.000.000
		Realizar un sostenimiento anual durante los dos primeros años a 175 hectáreas de plantulas sembradas en las actividades de herramientas de manejo del paisaje.	58.000.000	Héctareas Interven	70	28	40,00%	56.824.947



CO-SIQ-CER893794



SC-CER893764



GP-CER603861



EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES	APROBADO	META	META ALCANZADA	% EJECUCION	EJECUTADO	
6. CONSTRUYENDO UN AMBIENTE PARA LA PAZ	Mejoramiento de la cultura ambiental	Conformar y/o reactivar 24 Clubes Defensores del Agua en Instituciones Educativas.	12.000.000	Clubes conformados	6	8	100%	12.000.000
		Financiar 40 proyectos resultantes de los Clubes Defensores del Agua conformados (Instituciones Educativas).	60.000.000	Proyectos financiados	10	9	90,00%	54.000.000
		Participar en 10 Comités Interinstitucionales de Educación ambiental (CIDEA) en Desarrollo del programa Manejo Integral del Agua MIA, en 12 municipios.	11.000.000	Comités Interinstitucionales Atendidos	10	11	100	11.000.000
		Realizar 54 conversatorios ecológicos en Instituciones en especial educativas.	16.000.000	Municipios Atendidos	3	2	66,67%	15.144.690
		Realizar 54 conversatorios ecológicos en Instituciones en especial educativas.	5.000.000	Conversatorios realizados	12	83	100%	5.000.000
	Creación de la cultura de la Ecoeficiencia	Programa de Ecoeficiencia.	20.000.000	Programa Diseñado e Implementado	100,00%	100,00%	100,00%	17.040.000
TOTAL			18.016.336.234				15.124.762.860	

6.2 Tarifas

ACUAVALLE S.A. E.S.P., aplicó desde julio de 2016 la metodología tarifaria definida en la Resolución CRA 688 de 2014 en 16 Áreas de Prestación de Servicios APS que a diciembre de 2014 contaban con más de 5000 suscriptores, lo cual corresponde a 16 municipios. En las APS menores a 5000 suscriptores continúa aplicando la metodología definida en la Resolución CRA 287 de 2004, estando a la espera de la expedición de la metodología para pequeños prestadores.

Acorde a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, en el mes de marzo de 2017 aplicó un incremento del 3.16% a las tarifas de sus servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, al haber alcanzado el IPC acumulado un 3%, información que fue debidamente publicada en el Diario de Occidente y reportada al Departamento de Facturación y Recaudo para su respectiva aplicación.

6.3 Sistemas

La gestión referente a tecnologías de la información y la comunicación TICs que adelantó el Departamento de Sistemas durante la vigencia 2017, se orientó principalmente a proyectos de soporte y mantenimiento, conectividad y renovación tecnológica; garantizando de esta manera la continuidad de los servicios tecnológicos que se brindan a nuestros usuarios.

Se cubrieron cuatro frentes de trabajo que incluyeron los siguientes aspectos:


- Derecho de propiedad intelectual y derechos de autor:** Se debe indicar que de acuerdo al artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 2000, los productos protegidos por



ACUAVALLE S.A. E.S.P.

INFORME DE GESTION

AÑO 2018

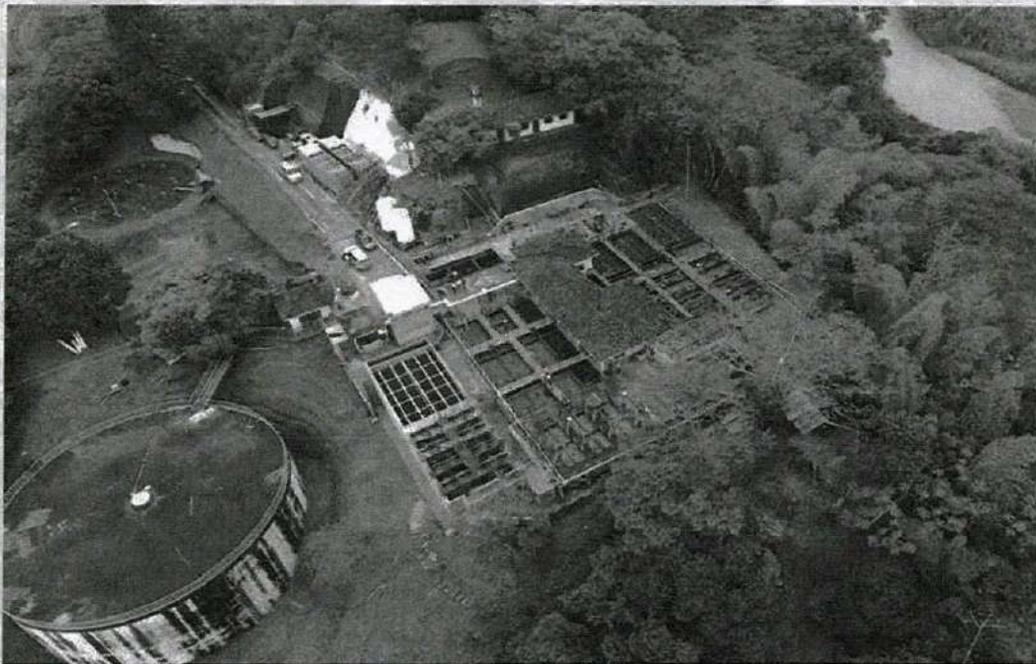

El Valle
está en
VOS



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

6. GESTION DE PLANEACION

6.1 Plan de Acción 2016–2019, Vigencia 2018

Mediante Acuerdo No.014 del 19 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de ACUAVALLE S.A.E.S.P. aprobó la actualización del Plan de Acción 2016-2019, para la vigencia 2018, por valor de \$ 26.838'054.000, de los cuales \$18.509'305.000 estaban financiados con recursos propios y \$8.328'749.000 con recursos de subsidios.

Producto de la incorporación de los excedentes financieros de la vigencia 2017, se destinaron \$10.756'965.553 al Plan de Acción de la vigencia 2018, modificando su valor inicial y situándose en \$37.595'019.553 así: Recursos Propios \$26.701.192.687 y Recursos Subsidios \$10.893.826.866. Lo anterior fue aprobado por la Junta Directiva el 7 de mayo de 2018, mediante Acuerdo No. 002.

Teniendo en cuenta que dentro del Presupuesto de ingresos se proyectó recaudar por concepto de cartera oficial de las instituciones educativas la suma de \$5.390'000.000 y por concepto de subsidios la suma de \$8.328'749.000, y el recaudo de estos ingresos presentaba al 30 de noviembre una ejecución del 60% para subsidios y del 19% en la cartera las instituciones educativas, se realizó un contracrédito de \$6.800.000.000 en el Plan de Acción, lo cual se realizó mediante Acuerdo No. 009 del 30 de noviembre de 2018.

Con las dos (2) modificaciones realizadas el Plan de Acción final se situó en \$30.795.019.553, y la ejecución al 31 de diciembre de 2018 alcanzó un valor de \$28.682'659.631, para una ejecución financiera del 93.14%.

El Plan de Acción está conformado por seis ejes, 14 programas y 30 proyectos que contienen los diferentes campos de acción en los que se trabaja y focaliza el direccionamiento estratégico de la empresa.

Los ejes 1 al 4, e igualmente el eje 6, representan el 16.61% de la ejecución total por un valor de \$4.763'031.357. En ellos se contemplan proyectos encaminados al mejoramiento de ingresos por parte del área comercial, proyectos de modernización tecnológica, de imagen corporativa, y de gestión del personal.

Se observa la ejecución por cada uno de los programas, donde el eje 5 "Mas agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad" tuvo una ejecución del 92.69% y una participación dentro del Plan de Acción del 83.39%, con un monto de \$23.919 millones.

PLAN DE ACCION POR EJES ESTRATEGICOS

EJE	APROBADO	EJECUTADO	% Participación			
			% Ejecución	Aprobado Ejecutado		
1	Gestion financiera.	1.439.974.000	1.432.889.393	99,51%	4,68%	5,00%
2	Recurso Humano Constructor de Bienestar	520.000.000	462.783.205	89,00%	1,69%	1,61%
3	Mejores servicios para nuestra comunidad.	921.000.000	762.779.913	82,82%	2,99%	2,66%
4	Gestion de procesos	1.328.807.553	1.327.680.409	99,92%	4,32%	4,63%
5	Mas agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad.	25.807.238.000	23.919.628.274	92,69%	83,80%	83,39%
6	Construyendo Ambiente para la Paz	778.000.000	776.898.437	99,86%	2,53%	2,71%
TOTAL		30.795.019.553	28.682.659.631	93,14%	100,00%	100,00%

En este eje se clasifican los proyectos de infraestructura de acueducto, alcantarillado y plantas, y se ejecutaron obras de inversión en estos componentes necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios prestados. La ejecución de proyectos de este eje arrojó la suscripción de noventa y tres (93) contratos, incluyendo adiciones en contratos de vigencias anteriores.

Al interior del eje el programa producción de agua potable representa el 34.24% con una ejecución de \$8.190 millones, el programa distribución de agua potable representa el 37% con una ejecución de \$8.850 millones, y el programa disposición de aguas residuales representa el 28.76% con una ejecución de \$6.879 millones.


PLAN DE ACCION POR PROGRAMAS

#	PROGRAMA	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTIC
1	Mejoramiento de ingresos	1.439.974.000	1.432.889.393	99,51%	5,00%
2	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	310.000.000	307.797.410	99,29%	1,07%
3	Desarrollo de Personal	130.000.000	108.518.704	83,48%	0,38%
4	Bienestar social	80.000.000	46.467.091	58,08%	0,16%
5	Imagen Corporativa	733.000.000	672.099.863	91,69%	2,34%
6	Atención a Clientes y partes interesadas	188.000.000	90.680.050	48,23%	0,32%
7	Sistemas integrales de Gestión	690.000.000	689.434.740	99,92%	2,40%
8	Sistemas de información corporativo	638.807.553	638.245.669	99,91%	2,23%
9	Producción de agua potable	9.382.758.000	8.190.324.786	87,29%	28,55%
10	Distribución de agua Potable	9.043.350.000	8.850.359.095	97,87%	30,86%
11	Disposición de aguas residuales	7.381.130.000	6.878.944.393	93,20%	23,98%
12	Conservación y Recuperación del recurso hídrico	671.000.000	670.765.104	99,96%	2,34%
13	Mejoramiento de la cultura ambiental	107.000.000	106.133.333	99,19%	0,37%
14	Creación de la cultura de la Ecoeficiencia	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL		\$30.795.019.553	\$28.682.659.631	93,14%	100,00%

El Plan de Acción ejecutado fue financiado el 76.39% con recursos propios y el 23.61% con recursos de subsidios, con montos de \$21.910'779.314 y \$6.771'880.317 respectivamente.

Durante la vigencia 2018 el Plan de Acción presenta un incremento en su ejecución del 214.83% respecto a la vigencia 2016, y del 89.6% frente a la vigencia 2017, para una ejecución acumulada del 88.64% en el periodo 2016- 2018. Igualmente se observa que la ejecución de la vigencia 2018 aumento respecto las dos vigencias anteriores.

EJE	EJECUTADO	
	\$	%
EJE 1	1.432.889.393	5,00%
EJE 2	462.783.205	1,61%
EJE 3	762.779.913	2,66%
EJE 4	1.327.680.409	4,63%
EJE 5	23.919.628.274	83,39%
EJE 6	776.898.437	2,71%
TOTAL	28.682.659.631	100,00%

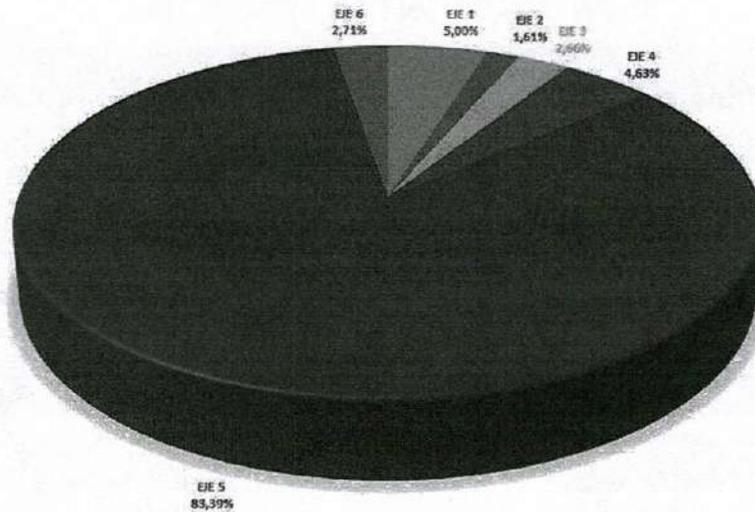

Eje	Programa	EJE Y PROGRAMA	EJECUCION 2016	EJECUCION 2017	EJECUCION 2018	VARIACION 2018 Vs 2016	VARIACION 2018 Vs 2017
1		Gestion financiera.	230.424.134	214.196.401	1.432.889.393	521,85%	568,96%
	1	Mejoramiento de Ingresos	230.424.134	214.196.401	1.432.889.393	521,85%	568,96%
2		Recurso Humano Constructor de Bienestar	1.800.348.551	26.838.000	462.783.205	-74,29%	1624,36%
	2	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	13.419.000	26.838.000	307.797.410	2193,74%	1046,87%
	3	Desarrollo de Personal	1.729.069.551	0	108.518.704	-93,72%	0,00%
	4	Bienestar social	57.860.000	0	46.467.091	-19,69%	0,00%
3		Mejores servicios para nuestra comunidad.	112.723.940	137.702.290	762.779.913	576,68%	453,93%
	5	Imagen Corporativa	85.000.000	128.018.790	672.099.863	690,71%	425,00%
	6	Atención a Clientes y partes interesadas	27.723.940	9.683.500	90.680.050	227,08%	836,44%
4		Gestion de procesos	45.000.000	1.617.222.443	1.327.680.409	2850,40%	-17,90%
	7	Sistemas integrales de Gestión	45.000.000	612.173.700	689.434.740	1432,08%	12,62%
	8	Sistemas de información corporativo	0	1.005.048.743	638.245.669		-36,50%
5		Mas agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad.	6.506.331.858	12.529.214.089	23.919.628.274	267,64%	90,91%
	9	Producción de agua potable	3.071.116.273	6.494.523.739	8.190.324.786	166,69%	26,11%
	10	Distribución de agua Potable	1.755.524.671	1.628.803.359	8.850.359.095	404,14%	443,37%
	11	Disposición de aguas residuales	1.679.690.914	4.405.886.991	6.878.944.393	309,54%	56,13%
6		Construyendo Ambiente para la Paz	415.715.000	599.589.637	776.898.437	86,88%	29,57%
	12	Conservación y Recuperación del recurso hídrico	350.000.000	485.404.947	670.765.104	91,65%	38,19%
	13	Mejoramiento de la cultura ambiental	65.715.000	97.144.690	106.133.333	61,51%	9,25%
	14	Creación de la cultura de la Ecoeficiencia	0	17.040.000	0	0,00%	-100,00%
TOTAL EJECUTADO			9.110.543.483	15.124.762.860	28.682.659.631	214,83%	89,64%
TOTAL PROYECTADO			10.888.000.000	18.016.336.234	30.795.019.553		
			83,68%	83,95%	93,14%		

Se presenta el detalle del Plan de Acción aprobado y ejecutado consolidado por proyecto.

EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES		PLAN DE ACCION INICIAL	PLAN DE ACCION EXCEDENTES	PLAN DE ACCION DEFINITIVO	EJECUCION DICIEMBRE DE 2018	INDICADOR	META	LOGRO		
EJE	PROGRAMA: Mejoramiento de ingresos											
	PROYECTO											
1. GESTION FINANCIERA	Micromedición	PY001	Instalar y/o reponer los medidores	PY0011	15.000.000	15.000.000	0	0	Cobertura de Micromedición	%	98,80%	99,77%
			Creación del Fondo de Reposición de Medidores	PY0012	40.000.000	40.000.000	40.000.000	38.809.803				
	Reducción de Pérdidas	PY002	Actualizar el censo de usuarios, ejecutar y hacer seguimiento efectivo a las suspensiones y reinstalaciones	PY0021	250.000.000	250.000.000	715.000.000	714.905.590	Metros Cúbicos Facturados por Suscriptor Mes	m ³	8,30	7,96
			Identificación y eliminación de fraudes del servicio y conexiones clandestinas.	PY0023	865.000.000	465.000.000 400.000.000	0	0				
			Minimizar errores en las lecturas de los medidores.	PY0024	100.000.000	0	0	0				
			Realizar análisis y seguimiento a grandes consumidores	PY0025	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000				
			Implementar el cobro persuasivo y ejecutivo	PY0032	279.974.000	279.974.000	264.974.000	264.974.000				
	Recuperación de Cartera	PY003	Implementar el cobro persuasivo y ejecutivo	PY0032	279.974.000	279.974.000	264.974.000	264.974.000	Rotación de Cartera	Días	62	65
	Optimización y Control de Costos y Gastos	PY004	Optimizar las compras y racionalizar los inventarios	PY0043	100.000.000	100.000.000			Depurar y Sanear Inventario de costos ABC	%	80,00%	
			Racionalizar procesos y procedimientos	PY0045	220.000.000	220.000.000	220.000.000	214.200.000	Implementar costos ABC	%	100,00%	0,00%
Nuevos Negocios y Mercados	PY005	Realizar análisis, evaluación y estudios de mercado	PY0051	20.000.000				Negocios Gestionados	#	1	5	
		Gestionar Recursos para financiar y ejecutar proyectos	PY0053	20.000.000				Proyectos Financiados	#	1	0	
	PROGRAMA: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo											
2. RECURSO HUMANO: CONSTRUCTOR DE BIENESTAR	Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	PY006	Implementación de la matriz de riesgos generales al interior de las empresas	PY0062	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Programa Definido e Implementado	%	100,00%	100,00%
			Adquirir equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgo.	PY0063	250.000.000	250.000.000	210.000.000	207.797.410				
	PROGRAMA: Desarrollo de Personal											
	Mejoramiento de la estructura organizacional	PY007	Revisar, ajustar e implementar el proceso de Inducción y/o reinducción	PY0073	20.000.000	20.000.000				%	100,00%	20,00%
			Establecimiento e implementación del Plan de Incentivo	PY0081	24.000.000	24.000.000			Plan de Incentivos Establecido e Implementado	%	20,00%	0,00%
	Mejoramiento de las Competencias del Personal	PY009	Capacitación para disminuir la brechas entre el perfil del funcionario y el perfil requerido para el cargo que...	PY0091	15.000.000	15.000.000			Cubrimiento de Competencias	%	95,00%	30,00%
			Ejecutar el Plan de Capacitación	PY0092	205.000.000	205.000.000	45.000.000	33.797.500				
			Diseñar e implementar el seguimiento a la Gestión Individual.	PY0093	125.000.000	125.000.000	85.000.000	74.721.204				
	PROGRAMA: Bienestar social											
	Ejecución del Proyecto Plan de Vida	PY010	Programar Talleres de Capacitación para los funcionarios y su grupo familiar.	PY0101	60.000.000	60.000.000	60.000.000	31.518.564	Talleres Realizados Funcionarios Capacitados	#	4	9
								%	80,00%	92,52%		
Estudio de Clima organizacional	PY011	Diseñar y elaborar encuestas para medir el clima organizacional de la entidad para generar un diagnóstico y definir el plan de acción a implementar.	PY0111	20.000.000	20.000.000	20.000.000	14.948.527	Plan de Acción implementado	%	60,00%	100,00%	

EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES	PLAN DE ACCION INICIAL	PLAN DE ACCION EXCEDENTES	PLAN DE ACCION DEFINITIVO	EJECUCION DICIEMBRE DE 2018	INDICADOR	META	LOGRO			
3. MEJORES SERVICIOS PARA NUESTRA COMUNIDAD	PROGRAMA: Imagen Corporativa											
	Mejoramiento y/o Adquisición de sedes	PY012	Adecuación, mejoramiento y/o Mantenimiento sedes de Propiedad de la Empresa.	PY0121	500.000.000	500.000.000	225.000.000	209.200.263	Sedes intervenidas	#	2	3
	Mejoramiento y ejecución del plan de comunicación	PY013	Diseño y elaboración de encuestas para medir la percepción del Cliente.	PY0131	50.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Nivel de Satisfacción de los Usuarios	%	37,50%	
			Ejecutar acciones tendientes a definir y ejecutar la Identidad Corporativa.	PY0132	100.000.000	100.000.000	100.000.000	98.800.000				
			Diseñar estrategias que garanticen una adecuada y eficaz comunicación interna y externa.	PY0132	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000				
			Realizar actividades en los municipios relacionados con la prestación de los servicios.	PY0132	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.634.000				
			Apoyar y/o participar en la realización de eventos relacionados con el sector a las instituciones gemelas con la que se requieran.	PY0133	248.000.000	248.000.000	248.000.000	237.965.600				
				PY0134	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0				
				PY0135	20.000.000	20.000.000	20.000.000	7.500.000				
	PROGRAMA: Atención a Clientes y partes interesadas											
	Atención Al Cliente	PY014	Mantener actualizado a los funcionarios de atención al cliente en temas relacionados con Regulación, procesos comerciales, tarifas, PQR, rangos de consumo etc.	PY0141	33.000.000	33.000.000	33.000.000	22.440.000	Reclamos comerciales por facturación resueltas a favor del usuario en segunda instancia.	#	<=700	11
			mejorar la calidad del servicio prestado en las	PY0142	65.000.000	65.000.000	65.000.000	29.651.230				
			Generar espacios de integración participativa con la comunidad.	PY0143	20.000.000	40.000.000	40.000.000	35.123.820				
			Realizar reuniones de concertación y control.	PY0144	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0				
			Realización Talleres sobre monto de las tarifas, Facturación, PQR, y demás relacionadas con el contacto directo con los usuarios y las administraciones locales.	PY0145	50.000.000	50.000.000	30.000.000	3.465.000				
Apoyar eventos programados por la SPD, CRA, Comites de Desarrollo y Control Social, Vocales de Control, etc.			PY0146	20.000.000	20.000.000	0	0					
						Indice General de Reclamos	%	4,0	1,22%			
4. GESTION DE PROCESOS	PROGRAMA: Sistemas integrales de Gestión											
	Mejoramiento de los Sistemas de gestión de Calidad y control interno, normas NTCGP-1000, 17025, MECI	PY015	Implementación de Acciones de mejora.	PY0151	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Sostenimiento Certificación Plantas	#	33	33
			Seguimiento a los controles.	PY0152	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000				
			Auditorias Internas y de Certificación.	PY0153	30.000.000	30.000.000	15.000.000	14.434.740				
			Diseño, Elaboración, ejecución y evaluación de indicadores.	PY0154	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000				
			Control Documental del Sistema de Gestión.	PY0155	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000				
	Elaboración del Plan Prospectivo	PY016	Elaboración del plan.	PY0161	200.000.000	200.000.000	185.000.000	185.000.000	Plan Prospectivo Formulada	%	100,00%	30,00%
	Elaboración planes de Riesgo	PY030	Planes de Riesgo	PY0301	0	380.000.000	380.000.000	380.000.000	Plan de Riesgo Elaborado	#	1	0
	PROGRAMA: Sistemas de información corporativo											
	Mejoramiento de los Sistemas Información Corporativo	PY018	Implementar y/o mejorar los sistemas de información.	PY0181	480.000.000	169.000.000	148.200.000	148.179.119	Sistemas Adquiridos y/o Mejorados	#	2	2
Adquisición de Equipos de computo y comunicaciones.			PY0182	70.000.000	358.507.553	351.507.553	350.975.780	Equipos Adquiridos	#	100	60	
Adquisición y/o actualización de licencias de software.			PY0183	150.000.000	283.000.000	139.100.000	139.090.770	Licencias Adquiridas	#	1	111	

EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES	PLAN DE ACCION INICIAL	PLAN DE ACCION EXCEDENTES	PLAN DE ACCION DEFINITIVO	EJECUCION DICIEMBRE DE 2018	INDICADOR	META	LOGRO			
PROGRAMA: Producción de Agua Potable												
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Control Operacional	Macromedición: Medición y control de caudales en la producción de agua en los municipios del Valle del Cauca	PY0191	450.000.000	450.000.000	342.500.000	320.073.447	Cobertura de Acueducto	%	100,00%	100,00%	
		Control del Sistema Lavado de Filtros PTAP.	PY0192	100.000.000	100.000.000							
		Optimización Electromecánica de equipos.	PY0193	515.000.000	901.000.000	901.000.000	837.207.987					
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Extensión y Optimización	Elaboración de estudios y diseños para el componente de producción de agua potable en los municipios del Valle del Cauca.	PY0201	132.000.000	132.000.000			Cobertura de Acueducto	%	100,00%	100,00%	
		Estudios y obras de nuevas fuentes de abastecimiento.	PY0202	2.732.000.000	2.832.000.000	2.122.000.000	2.080.060.897					
		Estudios y/o obras de ampliación y optimización de plantas.	PY0203	2.992.000.000	5.265.120.720	3.868.720.720	3.522.014.111					
		Estudios y obras de ampliación, rehabilitación, reposición, extensión y optimización de captaciones, desarenadores	PY0204	132.000.000	254.337.280	203.437.280	203.406.105					
		Estudios y obras de ampliación, rehabilitación, reposición, extensión y optimización de estaciones de bombeo.	PY0205	132.000.000	190.000.000		8.250.000					
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Control de Procesos de Tratamiento	Medición en línea de variables analíticas	PY0211	300.000.000	300.000.000	300.000.000	298.679.640	Costo de Energía	\$/m³	\$ 41,26	\$ 41,51	
		Equipos para la optimización/mejoramiento de los procesos	PY0212	250.000.000	381.800.000	297.800.000	297.090.449					
	Control de Calidad de Agua Cruda y Tratada	Monitoreo de calidad del agua tratada		PY0221	313.666.667	313.666.667	309.966.667	309.875.483	Calidad del Agua IRCA	%	0,22	1,1
				PY0222	313.666.667	313.666.667	313.666.667	313.666.667				
			PY0223	313.666.666	313.666.666	203.666.666	0					
PROGRAMA: Distribución de Agua Potable												
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Control Operacional	Macromedición.	PY0231	239.375.000	239.375.000	239.375.000	238.660.652	Índice de Agua no Contabilizada	%	32,00%	34,10%	
		Control y Telemetría de Redes de Distribución.	PY0232	275.625.000	1.761.825.000	1.576.262.683	1.575.197.593					
		Control de la operación, monitoreo y sectorización de redes.	PY0233	566.500.000	1.630.500.000	1.590.462.317	1.568.878.994					
		Control y reducción de pérdidas técnicas de Acuvallé S.A. E.S.P., en los municipios del Valle del Cauca.	PY0234	600.000.000								
	Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Extensión y Optimización	Estudios y obras de ampliación y/o rehabilitación del sistema de distribución.		PY0241	1.222.120.507	1.076.475.325	928.475.325	905.538.389	Continuidad del Servicio	%	97,00%	97,37%
					0	190.000.000	157.000.000	156.043.917				
					820.000.000	410.000.000	410.000.000	406.125.795				
			Estudios y obras de Reposición y/o Extensión del sistema de distribución.	PY0242	1.400.000.000	3.885.645.182	3.571.645.182	3.482.119.027				
				880.429.493	806.429.493	329.429.493	280.096.774					
Control de calidad de agua potable	Adquisición de Equipos para la medición de la Calidad del Agua.		PY0251	77.250.000	77.250.000	73.450.000	73.398.343	Cobertura Acueducto	%	100,00%	100,00%	
		Medición y control de los caudales y presiones en las redes.	PY0252	77.250.000	77.250.000	2.250.000	0					
		Monitoreo y control de la calidad del agua	PY0253	165.000.000	165.000.000	165.000.000	164.299.611					
PROGRAMA: Disposición de aguas residuales												
5. MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD	Ampliación, Rehabilitación, Reposición, Extensión y Optimización	Estudios y obras de ampliación y/o rehabilitación del sistema de recolección y/o transporte y/o del sistema de tratamiento de aguas	PY0261	908.530.000	908.530.000	495.330.000	18.720.787	Cobertura de Alcantarillado	%	98,80%	98,62%	
		Estudios y obras de reposición y/o extensión del sistema de recolección y/o transporte y/o del sistema de tratamiento de aguas residuales.	PY0262	4.630.500.000	7.134.500.000	6.885.800.000	6.860.223.606	Cobertura de Aguas Residuales	%	29,72%	19,14%	
		Monitoreo, Control y Medición de la Calidad del Agua Residual.	PY0263	319.500.000	319.500.000			Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Nuevas	#	1	0	

EJE	PROGRAMA, PROYECTO	ACTIVIDADES	PLAN DE ACCION INICIAL	PLAN DE ACCION EXCEDENTES	PLAN DE ACCION DEFINITIVO	EJECUCION DICIEMBRE DE 2018	INDICADOR	META	LOGRO		
PROGRAMA: Conservación y Recuperación del recurso hídrico											
6. CONSTRUYENDO O AMBIENTE PARA LA PAZ	Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas abastecedoras de los acueductos	PY0271	Realizar actividades de conservación, protección y restauración ambiental mediante el establecimiento de 105 kilómetros de aislamientos en zonas de nacimientos de agua y amortiguamiento en cuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras.	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kms de aislamiento intervenidos	Kms	30	10
		PY0272	Realizar actividades de restauración mediante el enriquecimiento forestal con especies nativas de 100 Hectáreas en zonas de nacimientos de agua y amortiguamiento en cuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras.	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Hectáreas Restauradas	Hectareas	25	0
		PY0273	Realizar actividades de restauración mediante el establecimiento de 75 hectareas de sistemas silvopastoriles en zonas de amortiguamiento en cuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras.	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	Hectáreas Restauradas	Hectareas	20	0
		PY0274	Adelantar acciones para el mejoramiento de la calidad del agua mediante la implementación de 46 sistemas individuales en manejo de aguas servidas en cuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras de los acueductos operados.	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	Soluciones implementadas	#	12	0
		PY0275	Realizar actividades de restauración mediante la construcción de obras biomecánicas para el control de erosión en zonas de nacimientos de agua y amortiguamiento en 4 cuencas hidrográficas priorizadas abastecedoras.	56.000.000	56.000.000	56.000.000	55.826.517	Obras Biomecánicas Construidas	#	1	0
		PY0276	Realizar un sostenimiento anual durante los dos primeros años a 175 hectareas de plantulas sembradas en las actividades de herramientas de manejo del paisaje.	96.000.000	96.000.000	96.000.000	95.938.587	Héctareas intervenidas	#	115	69
		PY0277	Convenio con Parques Nacionales para la conservación, protección y restauración Ambiental mediante aislamiento en zonas de nacimiento de agua y enriquecimiento forestal con especies nativas	0	200.000.000	0	0	Convenio Firmado	#	1	0
6. CONSTRUYENDO O AMBIENTE PARA LA PAZ	Mejoramiento de la cultura ambiental	PY0281	Conformar y/o reactivar 24 Clubes Defensores del Agua en Instituciones Educativas.	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Clubes conformados	#	6	8
		PY0282	Financiar 40 proyectos resultantes de los Clubes Defensores del Agua conformados (Instituciones Educativas)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Proyectos financiados	#	10	10
		PY0283	Participar en 10 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA)	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Comités Interinstitucionales	#	10	14
		PY0284	Desarrollar el programa Manejo Integral del Agua MIA, en 12 municipios.	17.000.000	17.000.000	17.000.000	16.133.333	Municipios Atendidos	#	3	2
		PY0285	Realizar 54 conversatorios ecológicos en instituciones en especial educativas.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Conversatorios realizados	#	12	68
	Creación de la cultura de la Ecoeficiencia	PY0291	Programa de Ecoeficiencia.	22.000.000	22.000.000	0	Programa Diseñado e Implementado	#	100,00%	100,00%	
TOTAL			26.838.054.000	37.595.019.553	30.795.019.553	28.682.659.631					
EJECUCION					93,14%						

Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del Cauca








*Toda una historia de servicio
al Valle del Cauca*

1959 - 2019



INFORME DE GESTION 2019

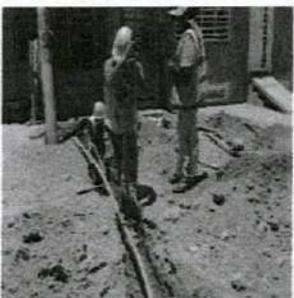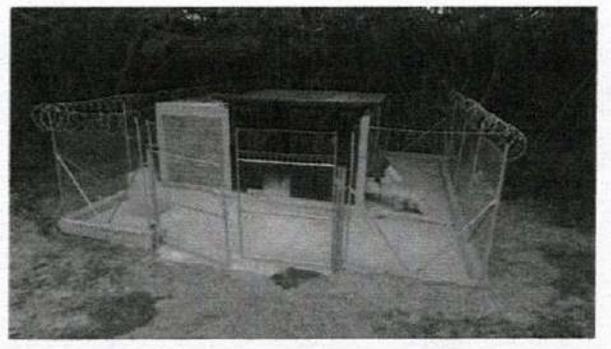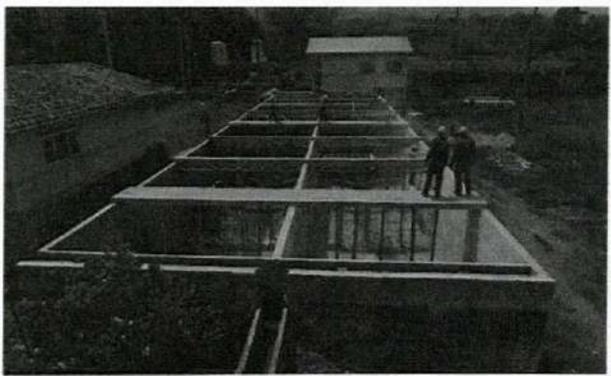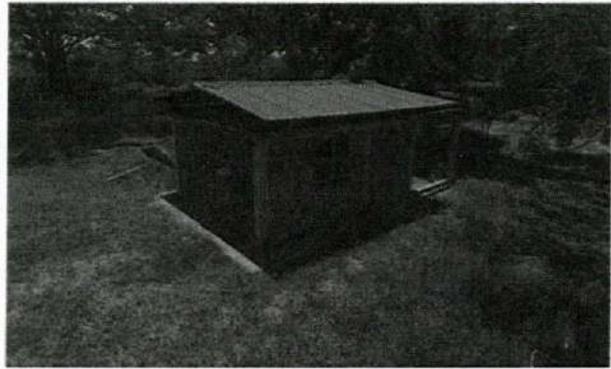

6. GESTIÓN DE PLANEACIÓN

6.1 PLAN DE ACCIÓN

Mediante Acuerdo No.013 del 26 de diciembre de 2018, la Junta Directiva de ACUAVALLE S.A.E.S.P. aprobó la actualización del Plan de Acción 2016-2019, para la vigencia 2019, por valor de \$ 34.034'326.000, de los cuales \$23.067'436.000 estaban financiados con recursos propios y \$9.966'890.000 con recursos de subsidios.

Producto de la incorporación de los excedentes financieros de la vigencia 2018, la venta de la sede administrativa y la recuperación de recursos que se encontraban embargados, se adicionaron al mismo la suma de \$17.817'965.553 al Plan de Acción de la vigencia 2018, modificando su valor inicial y situándose en \$50.852'072.148 así: Recursos Propios \$37.467.813.971 y Recursos Subsidios \$13.384.258.1776.

En el mes de diciembre de 2019 se realizó un contracrédito en el Plan de Acción por valor de \$8.500'000.000, sustentado en la no ejecución de recursos de cartera oficial de las instituciones educativas, una menor ejecución de los subsidios y de los ingresos operativos.

Con las modificaciones realizadas el Plan de Acción final se situó en \$42.352.072.148, y la ejecución al 31 de diciembre de 2019 alcanzó un valor de \$38.286'811.726, para una ejecución financiera del 90.40%.

El Plan de Acción está conformado por seis ejes, 14 programas y 30 proyectos que contienen los diferentes campos de acción en los que se trabaja y focaliza el direccionamiento estratégico de la empresa.

Los ejes 1 al 4 y el 6 representan el 16.61% de la ejecución total por un valor de \$8.762'300.584. En ellos se contemplan proyectos encaminados al mejoramiento de ingresos por parte del área comercial, proyectos de modernización tecnológica, de imagen corporativa, y de gestión del personal.

Se observa la ejecución por cada uno de los programas, donde el eje cinco "Más agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad" tuvo una ejecución del 94.59% y una participación dentro del Plan de Acción del 77.11%, con un monto de \$29.525 millones.

PLAN DE ACCION POR EJES ESTRATEGICOS

Eje	EJE Y PROGRAMA	INICIAL 2019	PLAN DE ACCION DEFINITIVO	PLAN DE ACCION EJECUTADO	%
1	Gestion financiera.	1.205.800.000	1.400.800.000	514.561.572	36,73%
2	Recurso Humano Constructor de Bienestar	17.400.000	600.000.000	279.905.200	46,65%
3	Mejores servicios para nuestra comunidad.	1.650.000.000	7.149.470.000	6.826.076.324	95,48%
4	Gestion de procesos	640.000.000	1.130.000.000	289.790.000	25,65%
5	Mas agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad.	29.386.126.000	31.211.802.148	29.524.511.142	94,59%
6	Construyendo Ambiente para la Paz	135.000.000	860.000.000	851.967.488	99,07%
TOTAL		33.034.326.000	42.352.072.148	38.286.811.726	90,40%

En este eje se clasifican los proyectos de infraestructura de acueducto, alcantarillado y plantas, y se ejecutaron obras de inversión en estos componentes necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios prestados. Al interior del eje el programa producción de agua potable representa el 36.11% con una ejecución de \$13.825 millones, el programa distribución de agua potable representa el 24.69% con una ejecución de \$9.454 millones, y el programa disposición de aguas residuales representa el 16.31% con una ejecución de \$6.2459 millones.

PLAN DE ACCION POR PROGRAMAS


Eje	EJE Y PROGRAMA	PROYECTAOD	EJECUTADO	% PARTICIPACION	
	Mejoramiento de Ingresos	1.400.800.000	514.561.572	36,73%	1,34%
	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	220.000.000	213.495.000	97,04%	0,56%
	Desarrollo de Personal	325.000.000	11.410.200	3,51%	0,03%
	Bienestar social	55.000.000	55.000.000	100,00%	0,14%
	Imagen Corporativa	6.945.470.000	6.746.677.490	97,14%	17,62%
	Atención a Clientes y partes interesadas	204.000.000	79.398.834	38,92%	0,21%
	Sistemas integrales de Gestión	790.000.000	140.000.000	17,72%	0,37%
	Sistemas de información corporativo	340.000.000	149.790.000	44,06%	0,39%
	Producción de agua potable	14.795.570.760	13.825.745.688	93,45%	36,11%
	Distribución de agua Potable	9.478.530.103	9.454.012.454	99,74%	24,69%
	Disposición de aguas residuales	6.937.701.286	6.244.753.000	90,01%	16,31%
	Conservación y Recuperación del recurso hídric	725.000.000	724.955.012	99,99%	1,89%
	Mejoramiento de la cultura ambiental	111.000.000	106.187.313	95,66%	0,28%
	Creación de la cultura de la Ecoeficiencia	24.000.000	20.825.163	86,77%	0,05%
TOTAL		42.352.072.148	38.286.811.726	90,40%	100,00%


El Plan de Acción ejecutado fue financiado el 75.149% con recursos propios y el 24.86% con recursos de subsidios, con montos de \$ 28.768 y \$ 9.519 millones respectivamente.

Durante la vigencia 2019 el Plan de Acción presenta un incremento en su ejecución del 320.25% respecto a la vigencia 2016, del 153.14% frente a la vigencia 2017 y del 33.98% comparado con la vigencia 2018, para una ejecución acumulada del 89.33% en el período 2016- 2019.

Eje	Programa	EJE Y PROGRAMA	2016	2017	2018	2019	TOTAL	PARTICIPACION
1		Gestion financiera.	230.424.134	214.196.401	1.432.889.399	514.561.572	2.392.071.500	2,63%
	1	Mejoramiento de Ingresos	230.424.134	214.196.401	1.432.889.399	514.561.572	2.392.071.500	2,63%
2		Recurso Humano Constructor de Bienestar	1.800.348.551	26.838.000	462.783.205	279.905.200	2.569.874.956	2,82%
	2	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	13.419.000	26.838.000	307.797.410	213.495.000	561.549.410	0,62%
	3	Desarrollo de Personal	1.729.069.551	0	108.518.704	11.410.200	1.848.998.455	2,03%
	4	Bienestar social	57.860.000	0	46.467.091	55.000.000	159.327.091	0,17%
3		Mejores servicios para nuestra comunidad.	112.723.940	137.702.290	762.779.913	6.826.076.324	7.839.282.467	8,61%
	5	Imagen Corporativa	85.000.000	128.018.790	672.099.863	6.746.677.490	7.631.796.143	8,38%
	6	Atención a Clientes y partes interesadas	27.723.940	9.683.500	90.680.050	79.398.834	207.486.324	0,23%
4		Gestion de procesos	45.000.000	1.617.222.443	1.327.680.409	289.790.000	3.279.692.852	3,60%
	7	Sistemas Integrales de Gestión	45.000.000	512.173.700	689.434.740	140.000.000	1.486.608.440	1,63%
	8	Sistemas de información corporativo	0	1.005.048.743	638.245.669	149.790.000	1.793.084.412	1,97%
5		Mas agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad.	6.506.331.858	12.529.214.089	23.919.628.274	29.524.511.142	72.479.685.363	79,56%
	9	Producción de agua potable	3.071.116.273	6.494.523.739	8.190.324.786	13.825.745.688	31.581.710.486	34,67%
	10	Distribución de agua Potable	1.755.524.671	1.628.803.359	8.850.359.095	9.454.012.454	21.688.699.579	23,81%
	11	Disposición de aguas residuales	1.679.690.914	4.405.886.991	6.978.944.393	6.244.753.000	19.209.275.298	21,09%
6		Construyendo Ambiente para la Paz	415.715.000	599.589.637	670.765.104	851.967.488	2.538.037.229	2,79%
	12	Conservación y Recuperación del recurso hídrico	415.715.000	599.589.637	670.765.104	851.967.488	2.538.037.229	2,79%
TOTAL			9.110.543.483	15.124.762.860	28.576.526.298	38.286.811.726	91.098.644.367	100,00%
PROGRAMADO			101.944.427.935					
EJECUTADO			91.098.644.367					
% EJECUCION FINANCIERA			89,36%					

PARTICIPACION POR EJE

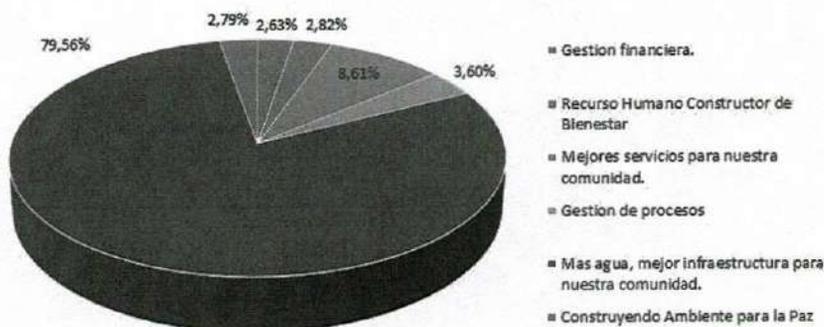



ACUAVALLE
Más Por Vos

**INFORME
DE GESTIÓN
2020**

- #MásInfraestructura**
- #MásComunidad**
- #MásTecnología**
- #MásMedioambiente**

6. GESTIÓN DE PLANEACIÓN

6.1 PLAN DE ACCIÓN.

El Plan de acción de la vigencia 2020 fue aprobado por la Junta Directiva el 27 de febrero de 2020 mediante acuerdo No. 002 de 2020.

El monto inicial aprobado asciende a \$37.644'202.438 con fuente de financiación subsidios y recursos propios.

Dentro del presupuesto inicial se habían dejado recursos globales para el plan de acción de la vigencia 2020 por valor de \$34.752'202.000, posteriormente producto de los excedentes financieros se adicionó un valor de \$2.892'000.438 para llegar al valor total antes descrito.

DESCRIPCIÓN	\$	%
RECURSOS PROPIOS	26.826.234.236	71,26%
RECURSO SUBSIDIOS	10.817.968.202	28,74%
TOTAL	37.644.202.438	100%

El plan de acción contiene 6 ejes estratégicos, de los cuales el eje 5 denominado Plan de Obras e Inversiones regulado POIR presenta la mayor participación dentro del total (93.15%), y en el cual se incluyen los proyectos de inversión en plantas de tratamiento de agua potable PTAP, acueducto, alcantarillado y preinversión los cuales contribuyen al mantenimiento, mejoramiento y expansión de la infraestructura que garantiza la prestación de los servicios y el cumplimiento de los estándares de calidad, continuidad y cobertura a nuestros suscriptores.

EJE	NOMBRE EJE	VALOR	PARTICIPACION
1	GESTION FINANCIERA	400.000.000	1,06%
2	RECURSO HUMANO CONSTRUCTOR DE BIENESTAR	343.440.000	0,91%
3	MEJORES SERVICIOS PARA NUESTRA COMUNIDAD	600.000.000	1,59%
4	GESTION DE PROCESOS	300.000.000	0,80%
5	PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO POIR	35.066.845.000	93,15%
6	CONSTRUYENDO AMBIENTE PARA LA PAZ	933.917.438	2,48%
	TOTAL	37.644.202.438	100,00%

Como consecuencia de la emergencia ocasionada por el COVID-19, y la situación económica del País durante la vigencia 2020, ACUAVALLE se vio afectada en el recaudo de sus ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos, por ende, fue necesario reducir el Plan de Acción, con lo cual el monto definitivo del mismo cerró en \$29.260'287.548, modificación que fue aprobada por la Junta Directiva de la Entidad el 30 de noviembre de 2020.

DESCRIPCION	\$	%
RECURSOS PROPIOS	21.832.528.547	74,61%
RECURSOS SUBSIDIOS	7.427.759.001	25,39%
TOTAL	29.260.287.548	100,00%

A diciembre 31 de 2020 la ejecución financiera del Plan de Acción cerró en \$27.056'132.611 para una ejecución del 92.47% frente al presupuesto aprobado.

La distribución por cada uno de los ejes se muestra en el siguiente cuadro, donde se observa que el eje 5 correspondiente al POIR representa el 94.51% del presupuesto total y cerró con una ejecución del 92.14%.

EJE	VALOR INICIAL	VALOR DEFINITIVO	PARTICIPACION DEFINITIVO	EJECUTADO	
				\$	%
EJE 1	330.000.000	55.127.072	0,19%	25.195.763	45,70%
EJE 2	343.440.000	253.439.365	0,87%	253.439.365	100,00%
EJE 3	670.000.000	343.218.705	1,17%	343.218.705	100,00%
EJE 4	300.000.000	176.745.275	0,60%	176.745.275	100,00%
EJE 5	35.066.844.999	27.652.737.032	94,51%	25.478.513.404	92,14%
EJE 6	933.917.438	779.020.099	2,66%	779.020.099	100,00%
TOTAL	37.644.202.437	29.260.287.548	100,00%	27.056.132.611	92,47%

Al analizar la ejecución del plan de acción por rubro presupuestal se obtuvo el siguiente resultado.

DESCRIPCION	VALOR DEFINITIVO	PARTICIPACION	EJECUCION	
			\$	%
CAPACITACION PROFESIONAL	6.490.200	0,02%	6.490.200	100,00%
EQUIPO DE COMPUTO, COMUNICACIONES Y SOFTWARE	176.745.275	0,60%	176.745.275	100,00%
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	149.449.165	0,51%	149.449.165	100,00%
HONORARIOS	97.500.000	0,33%	97.500.000	100,00%
MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS	39.920.490	0,14%	9.990.200	25,03%
MANTENIMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	82.008.765	0,28%	82.008.746	100,00%
MAQUINARIA	5.316.373.723	18,17%	4.687.689.896	88,17%
MATERIAL POP	36.931.412	0,13%	36.931.412	100,00%
MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	2.500.000	0,01%	2.499.000	99,96%
OBRAS DE ACUEDUCTO	8.191.875.034	28,00%	8.191.476.155	100,00%
OBRAS DE ALCANTARILLADO	3.605.117.425	12,32%	3.068.920.906	85,13%
OBRAS EDIFICIOS	102.593.812	0,35%	102.593.812	100,00%
OBRAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	5.109.050.358	17,46%	4.535.142.155	88,77%
PREINVERSION ACUEDUCTO	1.979.943.718	6,77%	1.922.943.718	97,12%
PREINVERSION ALCANTARILLADO	650.000.000	2,22%	649.963.800	99,99%
PREINVERSION MEDIO AMBIENTE	779.020.099	2,66%	779.020.099	100,00%
PREINVERSION PLANTAS AGUA POTABL	2.697.782.962	9,22%	2.319.782.962	85,99%
PROGRAMA INSTITUCIONAL TV	166.985.110	0,57%	166.985.110	100,00%
SERVICIOS TECNICOS	70.000.000	0,24%	70.000.000	100,00%
TOTAL	29.260.287.548	100,00%	27.056.132.611	92,47%

Los rubros relacionados con el eje 5 presentan la mayor participación y ejecución dentro del plan de acción siendo estos el 94.16% y 92.14% respectivamente.

Se presenta el plan de acción inicial, el definitivo y su respectivamente ejecución por cada uno de los ejes, programas y proyectos.

EJE	NOMBRE EJE	PROGRAMA	PROYECTO	VALOR INICIAL	VALOR DEFINITIVO	REDUCCION		EJECUCION FINANCIERA 2020	
						\$	%	\$	%
1	GESTION FINANCIERA	Mejoramiento de Ingresos	Identificación y eliminación de fraudes y conexiones clandestinas.	100.000.000	2.500.000	-97.500.000	-97,50%	2.499.000	99,96%
			Acreditación del Laboratorio de Medidores	300.000.000	52.627.072	-247.372.928	-82,46%	22.696.763	43,13%
2	RECURSO HUMANO CONSTRUCTOR DE BIENESTAR	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	250.000.000	246.949.165	-3.050.835	-1,22%	246.949.165	100,00%
		Desarrollo de Personal	Mejoramiento de las Competencias del Personal	93.440.000	6.490.200	-86.949.800	-93,05%	6.490.200	100,00%
3	MEJORES SERVICIOS PARA NUESTRA COMUNIDAD	Imagen Corporativa	Ejecución del plan de comunicaciones	350.000.000	236.985.110	-113.014.890	-32,29%	236.985.110	100,00%
			Adquisición y/o Mejoramiento de Sedes	0	69.302.183	69.302.183	0,00%	69.302.183	100,00%
		Atención a Clientes y partes interesadas	Atención Al Cliente	250.000.000	36.931.412	-213.068.588	-85,23%	36.931.412	100,00%
4	GESTION DE PROCESOS	Sistemas de Información corporativo	Mejoramiento de los Sistemas de Información Corporativo	300.000.000	176.745.275	-123.254.725	-41,08%	176.745.275	100,00%
5	PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO POIR	Producción de Agua Potable	Control Operacional	1.857.150.000	1.104.279.581	-752.870.419	-40,54%	1.104.279.581	100,00%
			Control de Procesos de Tratamiento	1.050.000.000	5.246.470.472	4.196.470.472	399,66%	4.652.147.862	88,67%
			Optimización Proceso de Producción	10.264.900.000	3.491.401.438	-6.773.498.562	-65,99%	2.864.110.781	82,03%
				2.767.175.000	399.500.000	-2.367.675.000	-85,56%	75.000.000	18,77%
		Transporte de Agua Potable	Optimización Sistemas de Conducción	214.000.000	0	-214.000.000	-100,00%	0	0,00%
		Distribución de Agua Potable	Control Calida agua potable	684.000.000	149.476.482	-534.523.518	-78,15%	114.997.719	76,93%
			Control Operacional	2.352.700.000	4.004.969.957	1.652.269.957	70,23%	4.004.969.957	100,00%
			Optimización Sistema de Distribución de Agua Potable	11.411.050.000	8.765.587.517	-2.645.462.483	-23,18%	8.708.188.638	99,35%
		Recolección y Transporte de Aguas Residuales	Control Operacional	242.000.000	235.934.160	-6.065.840	-2,51%	235.934.160	100,00%
Optimización sistema de Recolección y Transporte de Aguas Residuales	4.116.870.000		4.148.131.063	31.261.063	0,76%	3.611.898.344	87,07%		
Tratamiento y/o Disposición Final de Aguas Residuales	Optimización sistema de aguas residuales	107.000.000	106.986.362	-13.638	-0,01%	106.986.362	100,00%		
6	CONSTRUYENDO AMBIENTE PARA LA PAZ	Conservación y Recuperación del recurso hídrico	Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas abastecedoras de los acueductos	779.717.438	779.020.099	-697.339	-0,09%	779.020.099	100,00%
		Mejoramiento de la Cultura Ambiental	Educación Ambiental	154.200.000	0	-154.200.000	-100,00%	0	0,00%
TOTAL				37.644.202.438	29.260.287.548	-8.383.914.890	-22,27%	27.056.132.611	92,47%

Como se mencionó anteriormente el eje 5 denominado Plan de Obras e Inversiones Regulado corresponde a los proyectos de inversión que la empresa ejecuta, los cuales quedaron incorporados en la metodología tarifaria definida por la CRA. Las inversiones están direccionadas a cumplir con las metas de cobertura, continuidad, calidad del agua y reducción de pérdidas. Para ello las mismas apuntan al mejoramiento, optimización, reposición, rehabilitación y/o expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado como también de los procesos operativos.


En el servicio de acueducto se contrataron principalmente obras de reposición de redes en diferentes municipios y el tanque de almacenamiento de agua potable para el municipio de Guacarí.

Para el servicio de alcantarillado las obras contratadas corresponden a reposición, rehabilitación y expansión de redes de alcantarillado en varios municipios.

Las obras en las plantas de tratamiento de agua potable se direccionaron a la optimización de procesos operativos como son la filtración, floculación y sedimentación en diferentes PTAP, al sistema de tratamiento de lodos y optimización de la planta en el municipio de san pedro, obras en bocatomas y mejoramiento en la toma de datos para el seguimiento, control y monitoreo de caudales.

Igualmente se adquirió maquinaria y equipo requeridos en los procesos operación y tratamiento de las PTAP al igual que recursos en estudios e interventorías de las obras.

EJE	VALOR DEFINITIVO	PARTICIPACION
ACUEDUCTO	8.191.476.155	32,15%
ALCANTARILLADO	3.068.920.906	12,05%
PLANTAS DE TRATAMIENTO	4.535.142.155	17,80%
PREINVERSION INTERVENTORIA	4.892.690.480	19,20%
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.687.689.896	18,40%
EDIFICIOS	102.593.812	0,40%
TOTAL	25.478.513.404	100,00%

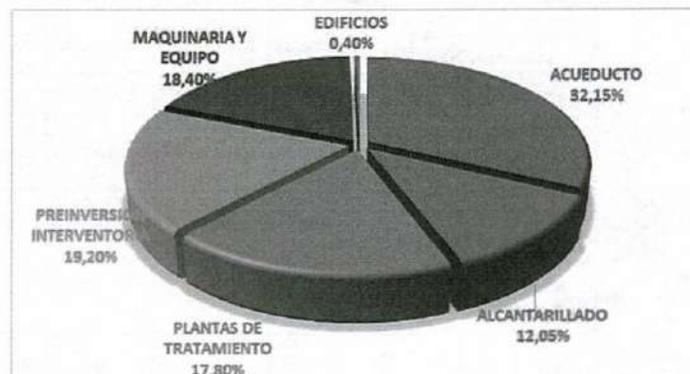


INVERSIONES EJECUTADAS 2020

MUNICIPIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	PLANTAS DE TRATAMIENTO	PREINVERSION INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPO	EDIFICIOS	TOTAL
Alcala				88.027.500			88.027.500
Andalucia	78.711.256		252.474.898	8.002.500	71.966.787		411.155.441
Ansermanuevo			250.925.061	95.565.675	111.576.948		458.067.684
Argelia		25.353.851	32.038.731	8.002.500			65.395.082
Bolivar	203.581.216		20.427.713	8.002.500	62.183.151		294.194.580
Bugalagrande	100.517.017	167.659.533	231.791.198	8.002.500	260.487.803		768.458.051
Caicedonia				77.253.600	30.122.124		107.375.724
Candelaria	21.300.000	507.549.608	407.123.352	49.677.730	120.488.498		1.106.139.188
Dagua	257.911.331	77.605.167	110.500.000	16.005.000	242.607.696		704.629.194
El Aguila				24.007.500	12.403.907		36.411.407
El Cairo				8.002.500			8.002.500
El Cerrito	190.179.932	24.477.743	65.753.600	459.718.209	289.720.098		1.029.849.582
El Dovio				96.030.000			96.030.000
Florida	283.479.522	304.062.935		16.005.000	363.299.075		966.846.532
Ginebra	305.965.129		193.561.597	8.002.500	155.397.006		662.926.232
Guacari	4.882.688.708	449.192.911	379.202.604	8.002.500	333.311.854		6.052.398.577
Jamundi	1.121.642.379	991.470.919		1.517.372.115	897.729.087		4.528.214.500
La Cumbre				157.966.300	30.122.124		188.088.424
La Unión	324.439.357	65.916.741		61.327.542	8.426.402		460.110.042
La Victoria				168.035.863			168.035.863
Obando				8.002.500			8.002.500
Pradera			279.931.895	305.938.455	67.610.826		653.481.176
Restrepo				116.005.000	8.426.402		124.431.402
Riofrio	57.933.779			16.005.000			73.938.779
Roldanillo	250.123.692	128.252.316		88.019.181			466.395.189
San Pedro		116.502.453	1.521.770.154	103.568.175	173.204.352		1.915.045.134
Sevilla		175.300.698		64.020.000	54.900.423		294.221.121
Toro	14.031.487	35.576.031	275.553.324	8.002.500	156.298.468		489.461.810
Trujillo			139.228.029	8.002.500	31.917.129		179.147.658
Ulloa			32.099.109	24.007.500			56.106.609
Vijes			165.981.089	184.052.635	380.786.861		730.820.585
Yotoco			176.779.801	66.005.000	68.548.526		311.333.327
Zarzal	98.971.350			168.052.500	117.967.080		384.990.930
BRUT					355.952.800		355.952.800
BUGA						102.593.812	102.593.812
VARIOS MPIO				850.000.000	282.234.469		1.132.234.469
TOTAL	8.191.476.155	3.068.920.906	4.535.142.155	4.892.690.480	4.687.689.896	102.593.812	25.478.513.404



INFORME DE GESTIÓN 2021

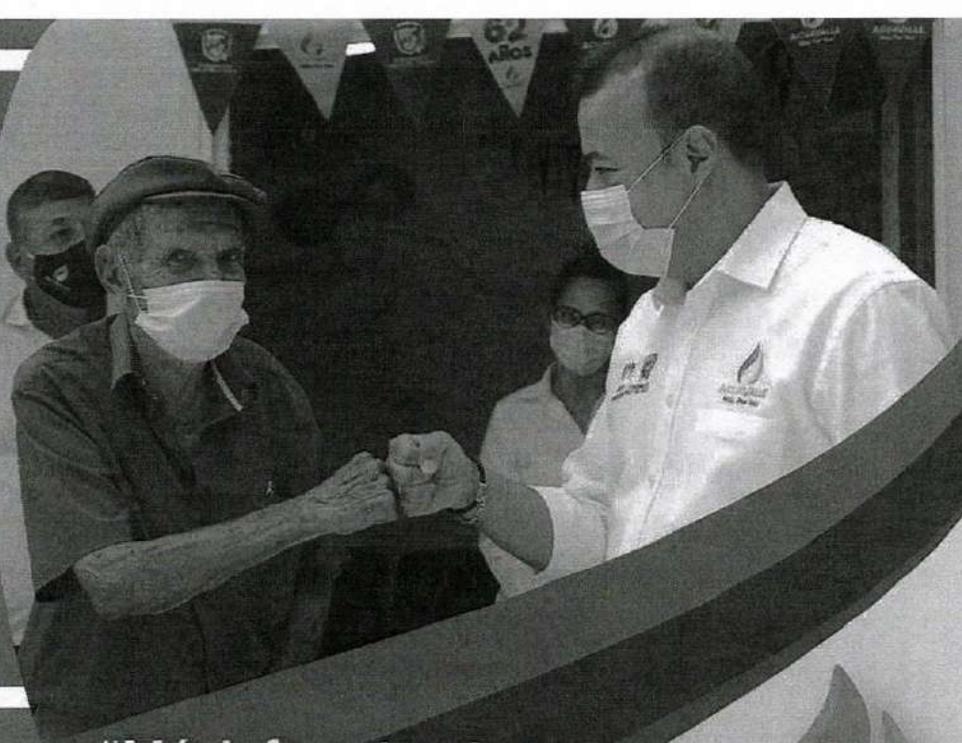


#MásInfraestructura


#MásComunidad


#MásTecnología

#MásMedioambiente



ACUAVALLE
Más Por Vos

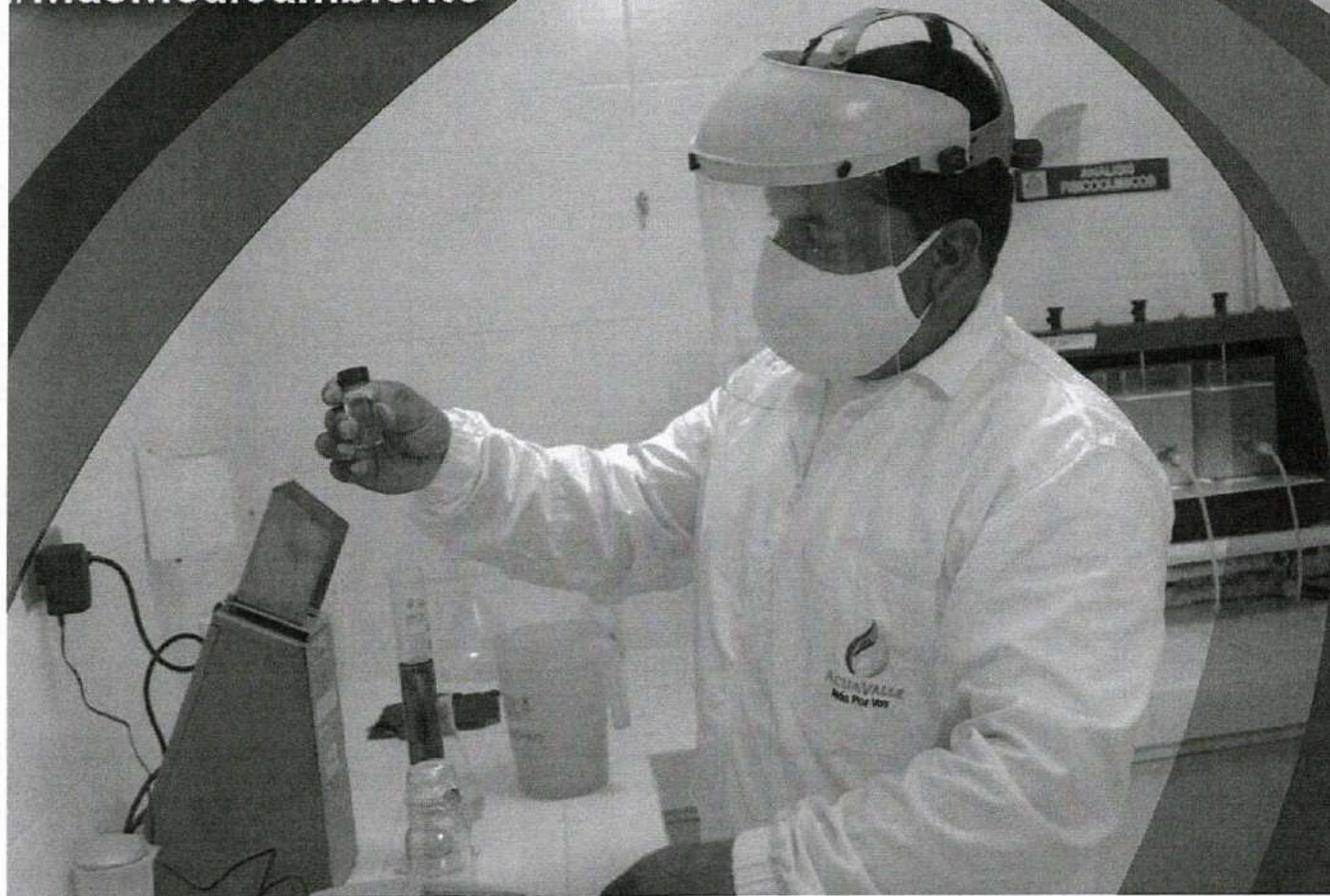



3. GESTIÓN DE PLANEACIÓN

3.1. PLAN DE ACCIÓN

El Plan de acción de la vigencia 2021 fue aprobado por la Junta Directiva el 30 de noviembre de 2020, posteriormente y producto de la incorporación de los excedentes financieros y modificaciones realizadas en la modalidad de traslados entre proyectos y reclasificaciones de objeto de gasto, el valor del plan de acción se sitúa en \$37.498.078.010

DESCRIPCION	VALOR
PLAN DE ACCION INICIAL	\$34.763.838.162
PLAN DE ACCION FINAL	\$37.498.078.010
VARIACION	\$2.734.239.848 7,87%

Tabla 2. Variación Plan de Acción

3.1.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las fuentes de financiación del plan de acción de la vigencia 2021 son recursos propios, recursos de subsidios y recursos del crédito los cuales se encuentran distribuidos en los montos y porcentajes descritos a continuación:

FUENTE DE FINANCIACION	TOTAL	PART
RECURSO PROPIO	15.863.742.744	42,31%
RECURSO SUBSIDIO	12.635.496.993	33,70%
RECURSO CREDITO	8.998.838.273	24,00%
TOTAL	37.498.078.010	100,00%

Tabla 3. Fuentes de Financiación



Ilustración 3. Fuentes de Financiación

3.1.2. CLASIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

La clasificación del Plan de Acción se agrupa en seis (6) ejes estratégicos, donde el eje 5 corresponde a los proyectos del POIR en cumplimiento de la metodología tarifaria establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. La composición del mismo por cada uno de los ejes es la siguiente:

EJE	NOMBRE EJE	VALOR APROBADO	PARTIC.
1	GESTION FINANCIERA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE	441.000.000	1,18%
2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	549.835.800	1,47%
3	CONFIANZA CIUDADANA	2.132.123.805	5,69%
4	TRANSFORMACION Y MODERNIZACION	278.528.162	0,74%
5	PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO POIR	33.160.400.243	88,43%
6	DESARROLLO SOCIAL Y EQUILIBRIO AMBIENTAL	936.190.000	2,50%
TOTAL		37.498.078.010	100,00%

Tabla 4. Clasificación Plan de Acción

3.1.3. EJECUCIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021, la ejecución financiera asciende a \$30.949'703.631, equivalente al 82.54%, donde el mayor porcentaje de ejecución se presenta en eje 5 el cual contiene los proyectos relacionados con el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR.

EJE	NOMBRE EJE	VALOR APROBADO	PARTIC.	REGISTROS PRESUPUESTALES		
				\$	Ejec.	Part.
1	GESTION FINANCIERA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE	441.000.000	1,18%	256.083.250	58,07%	0,83%
2	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	549.835.800	1,47%	236.714.175	43,05%	0,76%
3	CONFIANZA CIUDADANA	2.132.123.805	5,69%	1.989.914.156	93,33%	6,43%
4	TRANSFORMACION Y MODERNIZACION	278.528.162	0,74%	278.525.946	100,00%	0,90%
5	PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO POIR	33.160.400.243	88,43%	27.252.311.967	82,18%	88,05%
6	DESARROLLO SOCIAL Y EQUILIBRIO AMBIENTAL	936.190.000	2,50%	936.154.137	100,00%	3,02%
TOTAL		37.498.078.010	100,00%	30.949.703.631	82,54%	100,00%

Tabla 5. Ejecución Financiera Plan de Acción

6. GESTIÓN DE INVERSIONES

6.1. PROYECTOS GESTIONADOS.

El Plan de Acción 2021, concluyó con 68 contratos celebrados que representan una inversión de \$ 27.252'311.967 millones; y adicionalmente recursos aportados por los municipios de Guacarí, Zarzal y La Unión para los respectivos convenios por valor de \$4.026'586.017,00 millones.

La ejecución de las obras contratadas tiene un avance promedio del 36,7%; situación ocasionada principalmente por los efectos del paro nacional y las temporadas de intensas lluvias que afectaron todo el territorio del Valle del Cauca.

A continuación se relacionan los contratos en obras realizados por ACUAVALLE durante la vigencia 2021:

#	MUNICIPIO	CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
1	ARGELIA	003-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.	205.000.000
2	BOLIVAR	004-21	EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE BOLIVAR	286.409.800
3	SEVILLA	005-21	EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SEVILLA	296.575.728
4	VARIOS	008-21	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO SANITARIO A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021	28.950.000
5	JAMUNDI	052-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA.	310.378.022
6	TRUJILLO	052-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA.	61.784.803
7	ANDALUCIA	052-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA.	77.578.651
8	ANDALUCIA	052-21	MAYORES CANTIDADES DE OBRA AL CONTRATO 052-20, RESPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA.	41.038.026
9	EL CERRITO	063-21	CONSTRUCCION TANQUES DE CONTACTO DE CLORO PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y BOLIVAR.	308.720.021
10	VIJES	063-21	CONSTRUCCION TANQUES DE CONTACTO DE CLORO PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y BOLIVAR.	144.871.093
11	BOLIVAR	063-21	CONSTRUCCION TANQUES DE CONTACTO DE CLORO PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y BOLIVAR.	144.871.147

12	JAMUNDI	066-21	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	2.702.331.949
13	FLORIDA	067-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA.	72.039.515
14	YOTOCO	068-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO.	124.585.974
15	JAMUNDI	069-21	OPTIMIZACION EVACUACIÓN LODOS SEDIMENTADORES Y ADECUACIONES ELECTROMECÁNICAS FLOCULADORES PLANTA POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	1.302.825.124
16	JAMUNDI	069-21	OTRO SI No 1 ACLARATORIO CONTRATO 069-21 CUYO OBJETO ES" OPTIMIZACION EVACUACIÓN LODOS SEDIMENTADORES Y ADECUACIONES ELECTROMECÁNICAS FLOCULADORES PLANTA POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI".	6.000.000
17	GUACARI GUABITAS	070-21	OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS.	648.362.593
18	EL CERRITO STA ELENA	072-21	AMPLIACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EL CERRITO.	749.803.728
19	GUACARI	077-21	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUACARI.	299.263.449
20	YOTOCO	082-21	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO.	393.599.790
21	YOTOCO	082-21	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO.	144.269.950
22	OBANDO	083-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE OBANDO.	499.719.553
23	SAN PEDRO	084-20	"VALOR ADICIONAL AL CONTRATO 084-20 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO "	360.000.000
24	CANDELARIA	085-21	REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CARRERA 12 ENTRE CALLES 4 Y 5, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	180.138.244
25	SEVILLA	088-21	OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO UBICADO EN LA CARRERA 42 ENTRE CALLE 59 Y QUEBRADA BRASIL, EN EL BARRIO PROVIVIENDA, MUNICIPIO DE SEVILLA.	65.220.010
26	ANSERMANUEVO	094-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, Y LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA VIA DE ACCESO A LA PTAP DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO.	155.579.670
27	ANSERMANUEVO	094-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, Y LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA VIA DE ACCESO A LA PTAP DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO.	644.031.656
28	VARIOS	095-20	ADICION CONTRATO 095-20 CUYO OBEJTO ES" SERVICIO DE MONITOREO, CONTROL, PROCESAMIENTO, REPORTE DE DATOS OPERACIONALES, MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO, SISTEMA DE COMUNICACIONES Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ, SANTA ELENA, ANDALUCÍA, CAICEDONIA, YOTOCO, SEVILLA, ANSERMANUEVO, LA CUMBRE, GINEBRA, BUGALAGRANDE, JAMUNDÍ, DAGUA, PRADERA Y EL ACUEDUCTO REGIONAL FLORIDA – CANDELARIA".	345.623.366

29	PRADERA	100-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA.	499.997.740
30	JAMUNDI	101-21	EXTENSIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	199.909.292
31	EL AGUILA	104-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA.	298.402.973
32	ANSERMANUEVO	105-20	ADICION CONTRATO 105-20 CUYO OBJETO ES: " TERMINACION OPTIMIZACION PLANTA POTABILIZACION MUNICIPIO ANSERMANUEVO".	61.991.382
33	GUACARI	106-20	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO 106-20, DISEÑO Y CONTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO MUNICIPIO DE GUACARI.	500.000.000
34	CAICEDONIA	109-21	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA Y YOTOCO.	199.195.971
35	YOTOCO	109-21	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE CAICEDONIA Y YOTOCO.	371.526.002
36	ANDALUCIA	111-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA Y BUGALAGRANDE.	275.145.849
37	BUGALAGRANDE	111-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA Y BUGALAGRANDE.	249.650.574
38	SARA BRUT	112-21	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMA DE VIGILANCIA CON CAMARAS EN EL EMBALSE Y TANQUE DE QUIEBRE EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO REGIONAL DE AGUA –SARA-BRUT.	60.690.000
39	GINEBRA	114-21	OPTIMIZACION DEL SUMINISTRO DE AGUA CRUDA Y TRATADA DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE GINEBRA.	117.429.299
40	JAMUNDI	119-21	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y GEOFISICOS PARA LA UBICACIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO DE DOS (2) POZOS PROFUNDOS, DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.	173.516.506
41	ANDALUCIA	120-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO.	12.352.200
42	CAICEDONIA	120-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO.	12.352.200
43	LA CUMBRE	120-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO.	12.352.200
44	EL CERRITO	120-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO.	12.352.200
45	ANDALUCIA	121-20	ADICION CONTRATO 121-20 CUYO OBJETO ES: TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA Y BUGALAGRANDE.	79.243.170
46	BUGALAGRANDE	121-20	ADICION CONTRATO 121-20 CUYO OBJETO ES: TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA Y BUGALAGRANDE.	79.243.168

47	EL CERRITO	121-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y PRADERA.	25.754.575
48	FLORIDA	121-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y PRADERA.	25.754.575
49	JAMUNDI	121-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y PRADERA.	25.754.575
50	PRADERA	121-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y PRADERA.	25.754.575
51	GINEBRA	122-21	SECTORIZACION OPERACIONAL E HIDRAULICA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GINEBRA.	667.457.269
52	PRADERA	123-21	OBRAS COMPLEMENTARIAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE PRADERA Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TUBERIAS DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL PRADERA-CANDELARIA.	124.674.385
53	CANDELARIA	123-22	OBRAS COMPLEMENTARIAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE PRADERA Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TUBERIAS DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL PRADERA-CANDELARIA.	124.535.771
54	FLORIDA	124-21	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA.	122.244.176
55	FLORIDA	127-21	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA.	147.642.802
56	VARIOS	128-21	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ELECTROMECAVICOS PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE ACUAVALLE.	329.878.182
57	JAMUNDI	130-19	ADICIÓN CONTRATO 130-19: OBRAS DE OPTIMIZACION SEDIMENTADORES PLANTA 1 Y 2 PLANTA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	906.592.976
58	VARIOS	132-21	OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN EN LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE PRADERA, CANDELARIA, FLORIDA, JAMUNDÍ, CAICEDONIA, GINEBRA Y VIJES.	1.139.554.865
59	VARIOS	133-21	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ELECTROMECAVICOS PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE ACUAVALLE.	699.642.551
60	VIJES	135-21	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION PARA EL NUEVO POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE VIJES.	1.139.394.977
61	DAGUA	136-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, TRUJILLO Y BOLIVAR.	99.963.556
62	TRUJILLO	136-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, TRUJILLO Y BOLIVAR.	128.255.917
63	BOLIVAR	136-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, TRUJILLO Y BOLIVAR.	141.270.926

64	PRADERA	137-21	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA Y EL CERRITO.	449.922.388
65	EL CERRITO	137-21	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE PRADERA Y EL CERRITO.	349.917.145
66	ZARZAL	139-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL.	499.945.111
67	GUACARI	140-21	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI -	374.920.661
68	GUACARI	141-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI,	499.833.154
69	FLORIDA	143-21	SECTORIZACION OPERACIONAL E HIDRAULICA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AFGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA.	389.655.110
70	JAMUNDI	144-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	498.972.449
71	LA UNION	145-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION.	247.458.828
72	CANDELARIA	147-19/21	VAOR ADICIONAL CONTRARO 147-19, DISEÑO Y CONTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ACUEDUCTO REGIONAL PRADERA - CANDELARIA.	1.203.447.818
73	CANDELARIA	147-19/21	MAOR CANTIDAD AL CONTRATO 147-19, DISEÑO Y CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO REGIONAL PRADERA - CANDELARIA.	232.651.889
74	SEVILLA	149-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA,	297.194.286
75	ANSERMANUEVO	158-19	ADICIÓN CONTRATO 158-19 CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO."	140.984.015
76	ANDALUCIA	161-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y RESANES POR DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA,	174.617.603
77	VARIOS	163-21	SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE ACUAYALLE S.A. E.S.P.	114.575.324
78	ZARZAL	164-21	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y GEOFISICOS PARA LA UBICACIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO DE UN (1) POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL.	99.624.869
79	VARIOS	166-21	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS HIDRÁULICOS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA, BUGALAGRANDE, EL CERRITO, GUACARI, LA UNIÓN, PRADERA, ROLDANILLO, SEVILLA Y ZARZAL ".	179.863.777
80	LA CUMBRE	167-21	CONSTRUCCION DE MEJORAS EN SEGURIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE.	181.028.793
81	VARIOS	168-21	CONSTRUCCION DE MEJORAS EN SEGURIDAD EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE DAGUA, VIJES Y FLORIDA.	117.863.475
82	VARIOS	169-19	ADICION AL CONTRATO DE OBRA No. 169-2019 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA, GUACARI Y LA UNION".	99.860.437
83	VARIOS	169-19	ADICION AL CONTRATO 169-19, OPTIMIZACION PLANTAS DE POTABILIZACION MUNICIPIOS DE GUACARI, LA UNION Y ANDALUCIA.	301.790.301

84	ZARZAL	174-19	ADICIÓN CONTRATO 174-19: OPTIMIZACION PLANTA DE POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE ZARZAL.	157.025.594
85	SAN PEDRO	174-21	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.	224.650.653
86	DAGUA	175-21	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE DAGUA.	249.100.001
87	FLORIDA	177-21	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA Y PRADERA Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL.	131.160.015
88	PRADERA	177-21	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA Y PRADERA Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL.	122.135.005
89	ZARZAL	177-21	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA Y PRADERA Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL.	21.570.016
90	JAMUNDI	SOPER-025-2021	AVALUO COMERCIAL DE PREDIOS PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI.	35.000.000
91	VARIOS	STE-010-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021	28.950.000
92	VARIOS	STE-011-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021	18.950.000
93	VARIOS	STE-011-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021	10.000.000
94	VARIOS	STE-041-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO SANITARIO A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021	22.500.000
95	VARIOS	STE-049-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021	18.000.000
96	VARIOS	STE-050-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021	18.000.000

97	PRADERA - CANDELARIA	129-20	MAYOR CANTIDAD DE OBRA AL CONTRATO 129-20, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION LOSA DE CONCRETO PARA LA INSTALACION DE LA PTAP MODULAR EN EL ACUEDUCTO DE CANDELARIA - PRADERA "	52.094.009
TOTAL				\$ 27.252.311.967

Tabla 15. Contratos Subgerencia Técnica

En el siguiente grafico se evidencia las distribuciones de las inversiones realizadas enmarcadas en el Plan de Acción para la vigencia 2021.

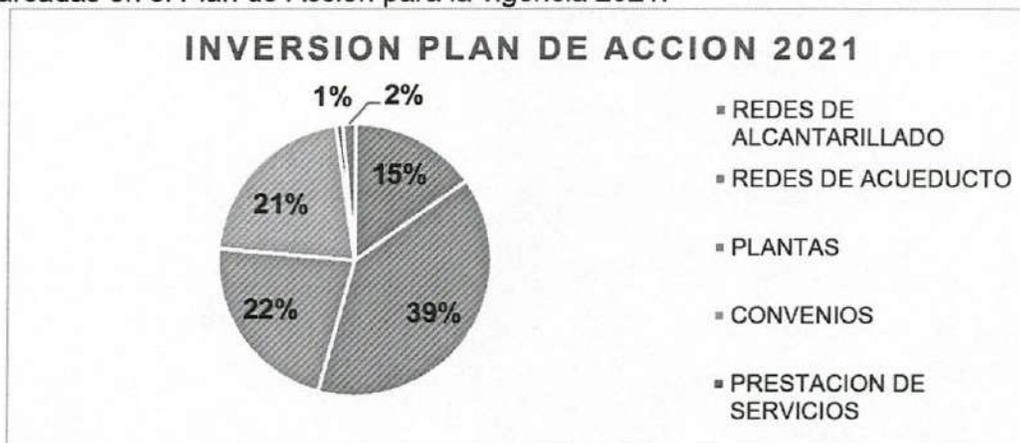


Ilustración 25. Inversión Plan de Acción 2021

La inversión realizada dentro del plan de acción para la intervención de redes de los diferentes municipios del Valle del Cauca se distribuyó en un 27 % para reposición de redes de alcantarillado y el 73% para reposición de redes de Acueducto.



Ilustración 26. Metros lineales de reposiciones en Acueducto y Alcantarillado



ACUAVALLE: POIR REGIONAL POR AÑO FISCAL \$DICIEMBRE 2020
RESOLUCIONES CRA 821 DE 2017 - 908 DE 2019 - 688 DE 2014 Y DECLARATORIA DE M. REGIONAL POR LA RESOLUCIÓN CRA 935 DE 2020

Acuavalle		Total	2020- 2 Semestre	2021	2022	2023
Acueducto		129.012.940.726	5.442.801.502	15.131.280.698	17.473.035.539	18.783.879.168
Distribución		102.595.357.976	1.448.333.651	7.226.165.435	11.924.344.246	16.695.771.683
Macromedición		5.658.511.336	34.087.103	1.451.028.303	2.257.592.803	1.235.238.920
Punto muestreo		199.899.686	99.949.843	99.949.843	-	-
Tanques compensación, almacenamiento, distribución		11.610.546.581	-	354.541.615	1.249.811.653	4.060.632.721
Tuberías y accesorios		85.126.400.373	1.314.296.705	5.320.645.674	8.416.939.790	11.399.900.042
Producción		26.417.582.750	3.994.467.851	7.905.115.263	5.548.691.293	2.088.107.485
Bocatoma subterránea		2.737.807.028	-	690.537.078	1.368.903.514	678.366.436
Bocatoma superficial		4.050.199.853	-	2.025.099.926	2.025.099.926	-
Desarenador		843.833.882	336.952.801	421.916.941	84.964.140	-
Equipos electromecánicos		572.617.777	155.988.635	286.308.888	130.320.253	-
Manejo de lodos y vertimiento		8.625.067.300	802.112.498	1.517.044.195	971.395.916	519.310.629
Plantas		2.609.195.961	963.113.298	963.113.298	-	93.608.597
Tanques contacto de cloro		3.259.922.273	938.447.420	938.447.420	-	-
Tubería flujo libre o presión (aducción)		3.718.938.678	797.853.198	1.062.647.516	968.007.544	796.821.823
Alcantarillado		116.388.666.041	6.735.637.160	14.097.072.218	13.531.455.864	12.269.623.332
Recolección y transporte		112.291.822.843	6.735.637.160	13.530.644.619	12.885.918.265	11.842.429.332
Colectores		1.989.930.116	-	380.888.280	994.965.058	614.076.778
Tuberías y accesorios		110.301.892.727	6.735.637.160	13.149.756.339	11.890.953.207	11.228.352.554
Tratamiento aguas residuales		4.096.843.198	-	566.427.599	645.537.599	427.194.000
Plantas FQ y biológicas		4.096.843.198	-	566.427.599	645.537.599	427.194.000
Total general		245.401.606.767	12.178.438.662	29.228.352.917	31.004.491.403	31.053.502.500

PLAN DE OBRAS E INVERSIONES.

ACUAVALLE S.A E.S.P.

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 1 Semestre
16.413.480.117	12.111.548.047	11.587.351.284	9.571.154.725	9.362.388.393	8.908.607.725	4.227.413.528
15.185.959.860	10.039.124.629	9.888.965.364	8.921.160.219	8.869.237.690	8.415.457.022	3.980.838.177
394.587.317	-	-	-	142.988.445	142.988.445	-
-	-	-	-	-	-	-
3.165.362.683	1.218.507.050	1.218.507.050	171.591.905	171.591.905	-	-
11.626.009.860	8.820.617.579	8.670.458.314	8.749.568.314	8.554.657.340	8.272.468.577	3.980.838.177
1.227.520.257	2.072.423.418	1.698.385.920	649.994.506	493.150.703	493.150.703	246.575.352
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.040.303.063	1.289.877.420	758.996.119	493.150.703	493.150.703	493.150.703	246.575.352
93.608.597	91.032.282	247.876.085	156.843.803	-	-	-
-	691.513.717	691.513.717	-	-	-	-
93.608.597	-	-	-	-	-	-
12.650.214.159	11.748.979.982	10.490.054.443	10.374.974.471	10.166.576.757	9.703.683.017	4.620.394.638
11.774.730.159	10.694.179.982	9.962.654.443	10.374.974.471	10.166.576.757	9.703.683.017	4.620.394.638
-	-	-	-	-	-	-
11.774.730.159	10.694.179.982	9.962.654.443	10.374.974.471	10.166.576.757	9.703.683.017	4.620.394.638
875.484.000	1.054.800.000	527.400.000	-	-	-	-
875.484.000	1.054.800.000	527.400.000	-	-	-	-
29.063.694.276	23.860.528.029	22.077.405.727	19.946.129.196	19.528.965.150	18.612.290.741	8.847.808.167
